

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

UCO980121LC9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Belisario Domínguez, 173, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414127007

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 MZG8501012NA
 USO CFDI: P01 - Por definir
 COLON, 62, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura 451

FOLIO FISCAL (UUID)
 C6C7CAF8-D157-49D4-A44E-855068F79463
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404141534
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-12-04T14:36:20
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-12-04T14:25:15
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N/A	<p>RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE LA CANTIDAD DE \$211,444.59(DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100MN) POR CONCEPTO DE LA 2 DA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYAN DELEGACION DE CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.</p> <p>AFIANZADORA: SOFIMEX S.A. FIANZA DE ANTICIPO No.:2252807 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:2252815 CONTRATO No.: DOP/FAIS33/2018-07/030 RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018</p> <p>MONTO PARA EFECTO AL PAGO: \$ 211,444.59</p> <p>Clave Prod. Serv. - 81101513 Gestión de construcción de edificios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 182,279.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29,164.77</p>	\$ 182,279.82	\$ 182,279.82



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 59/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 182,279.82
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 29,164.77
TOTAL \$ 211,444.59

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 CONTRATISTA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W0uUodQDjy1arx0M9Qva2bF9408iqga/ATEp9bsEVJORPpSw00Zzr6g0d2zkMibbBophxhqZbQnn23kZfJCYxwC/sen6ASrNCB6ND2JJaSeXzk8Cd5C6C4N4RXu62Gk0x7Ky4eGpW/1Y/brmo1pdm8LKZvcwkjsJW+LKtAM9bF6gx4UCMB1w3CYzOu4fpaHnwMzqIDU5fEGHjHgdGuaR5oYyUFUUhssNVCy5CHDGuE6BQKHV0wJx.CjCz9M RBE5mzE7CFqrqygeLQApZOM1VX0TuKDeRoiJwUIQBz36lPmJnj3H9jgV5JsiedSs81o/xQPZgUwlyvZ7UjEsb/HbMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lo++0UJzHq4GnWYmoWgU9jgskrpSH5EXOWO5Ys9Gkjos2W2lp1tBILR3ksNNrfsMNMUIHgcF1SmBmJw5QjKeYlQ2DcEoxC5m2LMwCbpZ6MaCH3ceF6T3SlcgeYr0 0wb/C8OT1VaLBP3bR6jXcT7CGQitSimNLpGLPA69BL0oWctup3lmt2VA3fKIPibBGhYy13UbZ2TtmVLQ0BxjwNKVesLdFA5JpD7HT0tXaZmJ+Zzh3RIP4g/mCVy03Zx OrSplqEh5JVv8ki+DqvczR9l3Mxu57lxVlho5VpzVILCcnlqYcnzCPv3cth00b/00KyeG3QnknrvlyCONfSD1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C6C7CAF8-D157-49D4-A44E-855068F79463|2018-12-04T14:36:20|FMD100203JS7|W0uUodQDjy1arx0M9Qva2bF9408iqga/ATEp9bsEVJORPpSw00Zzr6g0d2zkMibbBophxhqZbQnn23kZfJCYxwC/sen6ASrNCB6ND2JJaSeXzk8Cd5C6C4N4RXu62Gk0x7Ky4eGpW/1Y/brmo1pdm8LKZvcwkjsJW+LKtAM9bF6gx4UCMB1w3CYzOu4fpaHnwMzqIDU5fEGHjHgdGuaR5oYyUFUUhssNVCy5CHDGuE6BQKHV0wJx.CjCz9M RBE5mzE7CFqrqygeLQApZOM1VX0TuKDeRoiJwUIQBz36lPmJnj3H9jgV5JsiedSs81o/xQPZgUwlyvZ7UjEsb/HbMw==|00001000000405535779||

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES
 - 5 DIC 2018 14:35
 Folios Digitales®
 RECIBIDO
 N6:5A155770

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA : 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ASIGNACIÓN No. : DOP/FAIS33/2018-07

O. DE T. S/N

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C PERIODO: 15 AL 25 DE NOV DE 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"

LOCALIDAD : CIUDAD GUZMAN, JAL.

FECHA DE INICIO : 07 DE OCTUBRE DE 2018

ESTIMACIÓN : 2DA ESTIMACION

RESUMEN DE DOCUMENTO

IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$243,039.76	\$243,039.76
ADITIVA		
DEDUCTIVA		
ESCALATORIA		
16 % I.V.A.	\$38,886.36	\$281,926.12
AMORTIZACIÓN 25%	\$70,481.53	\$211,444.59
TOTAL A FACTURAR	\$211,444.59	

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE

AVANCE %

FECHA INICIAL	07 DE OCTUBRE 2018
FINANCIERO	77.65%
DOCUMENTO	0.00%
FISICO	70.20%
FECHA DE TERMINO	15 DE DIC. DE 2018

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$816,878.15	ESTA ESTIMACION	\$281,926.12	ANTICIPO 25 %	\$204,219.54
CONVENIO ADICIONAL		ACUM. ANTERIOR	\$291,531.11	AMORT. ANTERIOR	\$72,882.78
SUMA ESCALATORIA		ACUM. ACTUAL	\$573,457.23	ESTA AMORTIZACION	\$70,481.53
TOTAL	\$816,878.15	SALDO	\$534,952.03	TOTAL AMORTIZADO	\$143,364.31
				SALDO	\$60,855.23

DETALLES	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	SUMA
IMPORTE	\$182,279.82	\$-	\$-	0	\$182,279.82
16 % I.V.A.	\$29,164.77	\$-	\$-	0	\$29,164.77
TOTAL A FACTURAR	\$211,444.59	\$-	\$-	0	\$211,444.59
2 AL MILLAR INST. CAPAC.	\$0.00	\$-	\$-	0	\$-
5 AL MILLAR SFP	\$0.00	0	\$-	0	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$211,444.59	\$-	\$-	0	\$211,444.59

REFERENCIAS:

OBSERVACIONES:

<p>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA</p>	<p>ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ CONTRATISTA</p>
--	---	--

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIDO

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 1 DE 5

EST. No. 2

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"	CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-07
		MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
A01	PRELIMINARES								
01	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.90	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
02	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO LAS VECES QUE SE REQUIERA (UN SOLO PAGO)	M2	9.56	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
A02	PISO FIRME								
03	PISO DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	287.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
A03	INSTALACION PLUVIAL								
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO	M	90.49	45.00	21	24.00	0.00	0.00	\$ 2,171.76


ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 2 DE 5

EST. No. 2

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018- 07	FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
A04	ESTRUCTURA								
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	361.32	544.80	235.39	263.36	0.00	0.00	95,157.24
06	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.69	45.00	154	176.00	0.00	285.00	9,977.44
07	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C-150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	287.00	180.00	347.58	396.72	0.00	0.00	113,858.64

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 3DE 5

EST. No. 2

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'G=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	186.12	255.90	0	117.53	0.00	0.00	21,874.68
A05	CUBIERTA								
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA CON DIMENSIONES DE (80X24X9)CMS MARCA NOVACERAMIC. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA, NERVADURAS DE (10X9) CMS DE CONCRETO (F'G=200KG/CM2), CAPA DE COMPRESION DE LA MISMA CALIDAD DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6X6 10/10. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	441.52	180.00	0	0.00	0.00	0.00	-




ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 4 DE 5

EST. No. 2

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"
		MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.
		FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
10	TEN-079 TENDIDO DE ZAVALETA O CHAFLAN CON PEDACERA DE LADRILLO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP. 1:1:3	M	86.84	210.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
A06	INSTALACION ELECTRICA								
11	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO	SAL	638.62	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
12	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL OCULTA PARA CONTACTO SENCILLO	SAL	590.18	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
A07	PUERTAS Y VENTANAS								
13	INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X1.18 CON UN MODULO FIJO Y UN CORREDIZO CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3473.5	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -




ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. FILEMÓN LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: SDE 5

EST. No. 2

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018- 07	FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
14	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON MELANINA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4870.49	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$
A08	LIMPIEZA FINA DE OBRA								
15	LIMPIEZA FINA GENERAL DE OBRA	M2	14.25	180.00	0	0.00	0.00	0.00	\$

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE ESTA HOJA	\$ 243,039.76
TOTAL PRESENTE ESTIMACION	\$ 243,039.76
IMPORTE PARA FACTURACION	\$ 243,039.76
16% IVA	\$ 38,886.36
MEIOS IMPORTE ANTICIPO POR AMORTIZACION 25%	\$ 70,481.53
SUB-TOTAL	\$ 211,444.59
IMPORTE TOTAL POR PAGAR IVA INCLUIDO	\$ 211,444.59



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	03 DE DICIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO	CALLE UNICA #75		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #79		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #17A		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #80		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #50		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #56		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #1444		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-3
		CALLE UNICA #31		4"	3.000	1.000	M	3.000	(C) ENTRE 1-4

SUMA DE ESTA HOJA

M 24.00

Filemon Lopez Lopez

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Jose David Damian Rios

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2				

4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 4#				
---	--	--	--	--	--

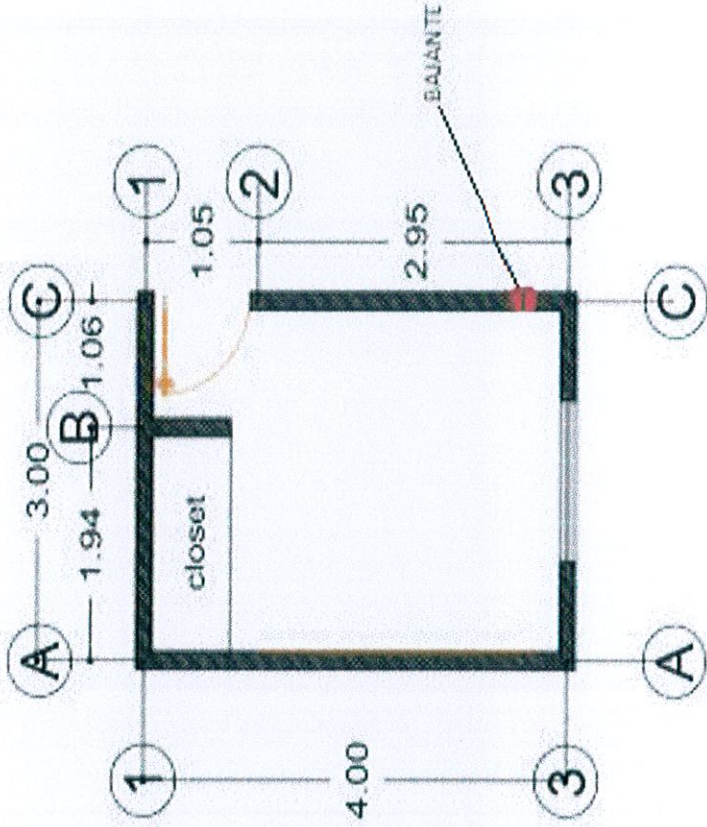

[Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



[Signature]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 2	CONTRATO: DOPIFAIS3/2018-07	

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 4#



Filemon Lopez Lopez

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

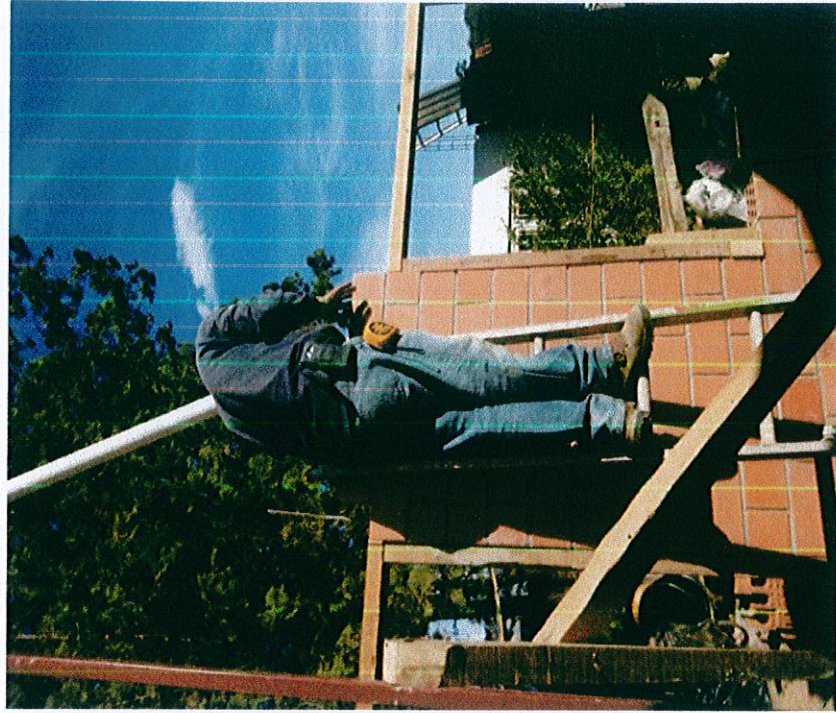

Jose David Damian Rios

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 75 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		CALLE UNICA #79 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		TOTAL							
								66.34	

SUMA DE ESTA HOJA

ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ

URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MUPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 17A puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		CALLE UNICA #80 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		TOTAL					M2	66.34	


ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
CONTRATISTA:	PLANO:	
NIVEL:	FECHA:	
	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MUXPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #50 puerta	4.000	0.000	2.45	2.000	M2	19.60	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
		pretil	2.760	0.000	2.45	2.000	M2	13.52	1-3 DE A -C
			1.32	0.000	1.18	1.000	M2	-1.56	C-C DE 2 A 3
			0.75	0.000	2.56	1.000	M2	1.92	B DE 1 A 2
			4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-A DE 1 A 3
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	1-3 DE A A C
						TOTAL	M2	33.17	
		CALLE UNICA #56 puerta	4.000	0.000	2.45	2.000	M2	19.60	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
		pretil	2.760	0.000	2.45	2.000	M2	13.52	1-3 DE A -C
			1.32	0.000	1.18	1.000	M2	-1.56	C-C DE 2 A 3
			0.75	0.000	2.56	1.000	M2	1.92	B DE 1 A 2
			4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-A DE 1 A 3
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	1-3 DE A A C
						TOTAL	M2	66.34	

SUMA DE ESTA HOJA


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 1444 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.54 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.170	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		CALLE UNICA # 31 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.54 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.170	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		TOTAL					M2	265.36	

SUMA DE GENERADOR

ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



SUMA DE GENERADOR


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2				
5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12				

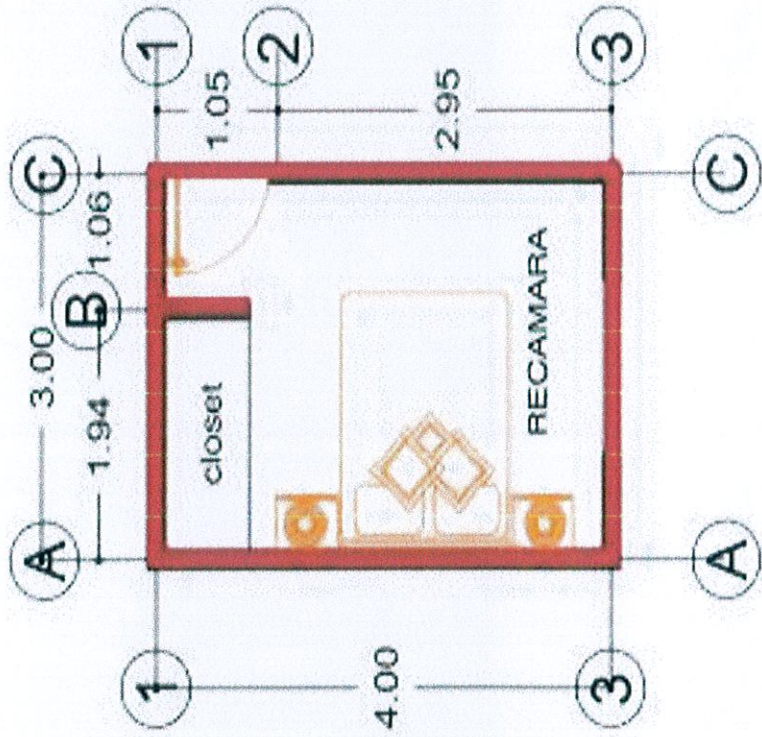

ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"			MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			CONTRATO: DOPI/FAIS3/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	
		FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018	

5 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12

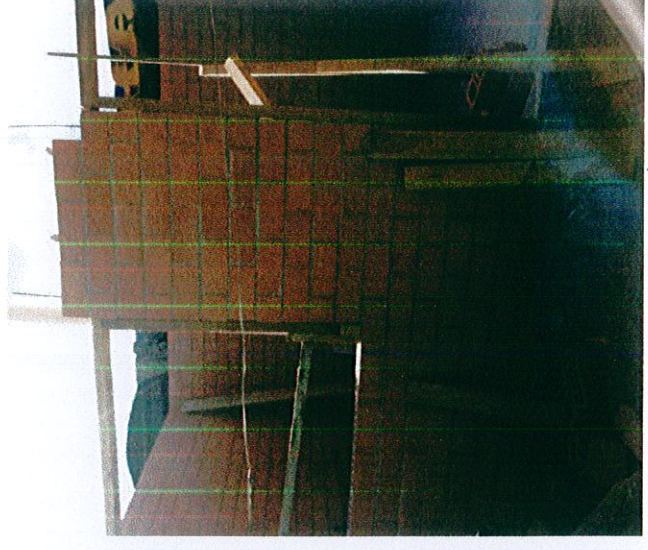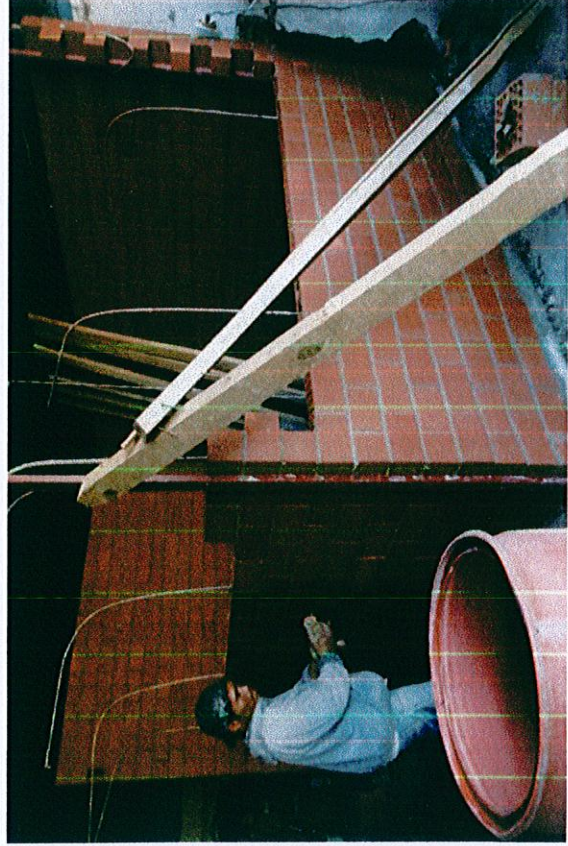

[Handwritten Signature]
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



[Handwritten Signature]
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	
	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	
	PLANO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
	FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	6 ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #75	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	EJES A DEL 1 A 2 C DE 1 A 3 1 DE 1 A 3 3 DE A -C
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	
						TOTAL	PZA	22.00	
			0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
			0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
			0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
							PZA	66.00	

SUMA DE ESTA HOJA



ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	6 ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #80	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	EJES A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
		CALLE UNICA #50	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
		CALLE UNICA #56	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
						TOTAL	PZA	66.00	



SUMA DE ESTA HOJA

ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	6 ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CALLE UNICA #1444 CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #31	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	EJES A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
			0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
							PZA	176.00	


SUMA DE GENERADOR
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




SUMA DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		
OBRA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 2		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.			

6	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"
---	--

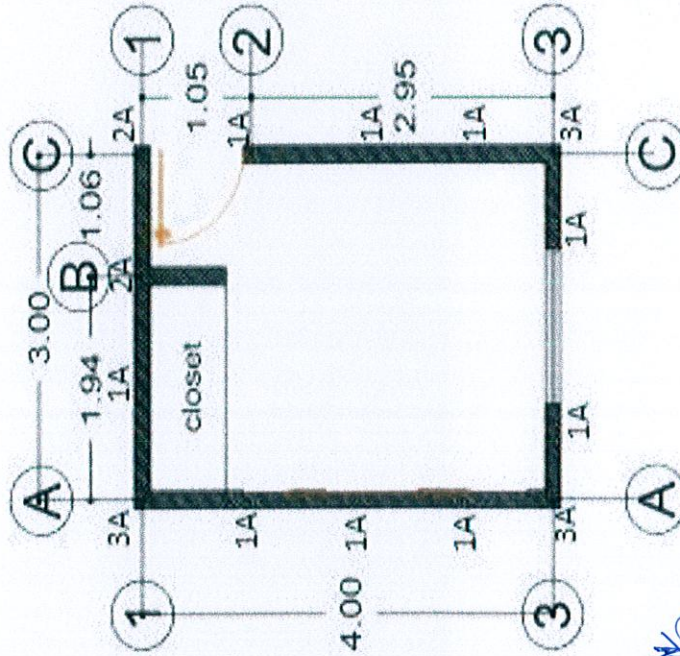

- 3A - 3 VARILLAS DE 3/8"
- 2A - 2 VARILLAS DE 3/8"
- 1A - 1 VARILLAS DE 3/8"

(Handwritten Signature)





ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2			
6	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"			

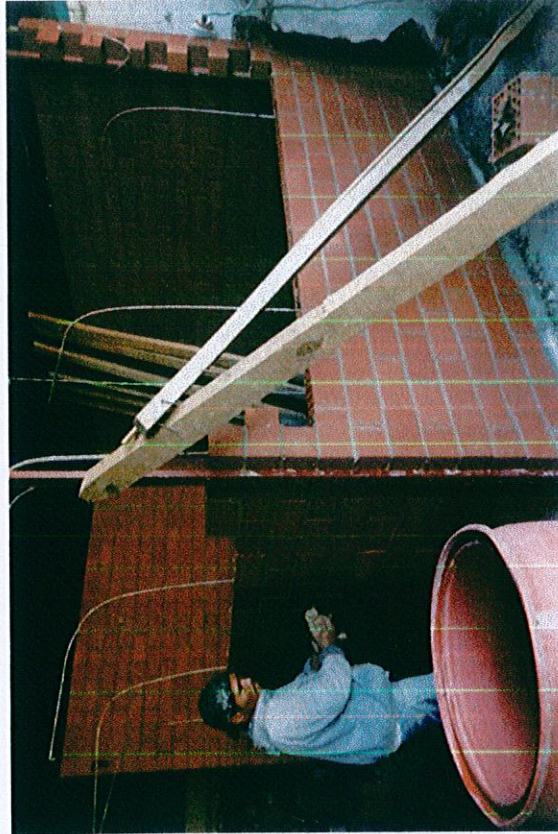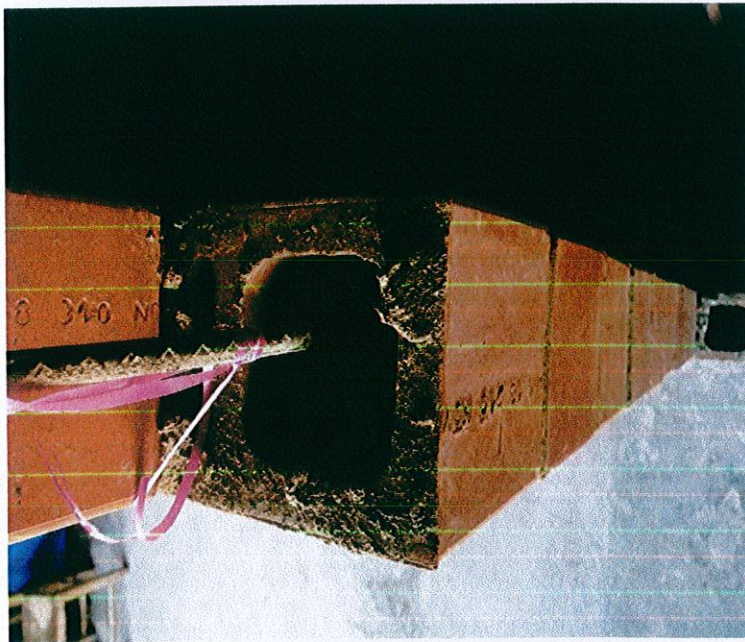

[Handwritten Signature]
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



[Handwritten Signature]
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #75	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	EJES A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	50.94	
		CALLE UNICA # 79	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	50.94	
		CALLE UNICA #17A	0.000	0.090	2.73	7.000	ML	19.11	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	6.000	ML	16.38	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	3.000	ML	8.19	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.73	2.000	ML	5.46	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
							ML	151.02	


SUMA DE ESTA HOJA




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F' C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #80	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	EJES A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
		CALLE UNICA # 50	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
		CALLE UNICA #56	0.000	0.090	2.73	7.000	ML	19.11	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	6.000	ML	16.38	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	3.000	ML	8.19	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.73	2.000	ML	5.46	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
							ML	147.42	

SUMA DE ESTA HOJA


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSÉ DAVID SAMIAN RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO CALLE UNICA #1444 (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	EJES A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
		CALLE UNICA #1444	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
							ML	396.72	

SUMA DE GENERADOR

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
OBRA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
CONTRATISTA:	EST. No. 2	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2018		

7	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2)
---	--

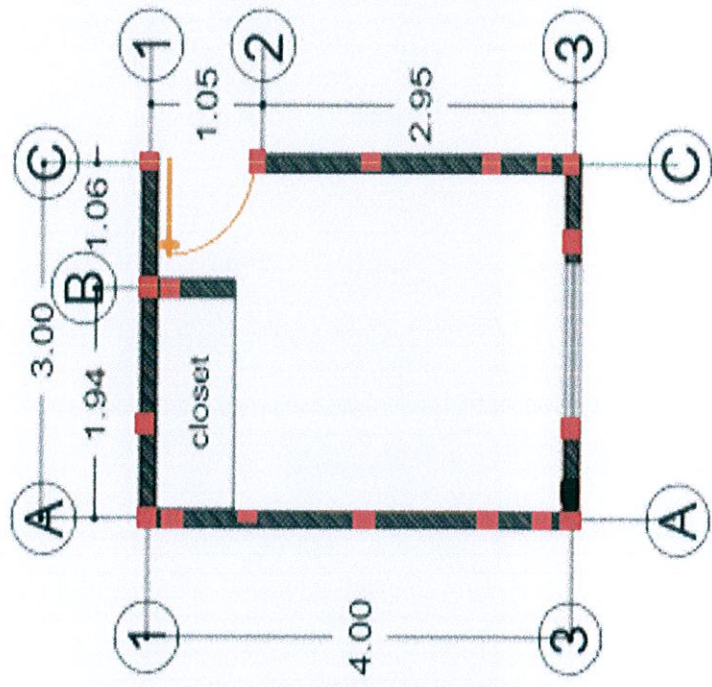

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

[Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 2	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07	
7	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2)		



(Handwritten signature in blue ink)

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(Handwritten signature in blue ink)

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVIA-A127-J186CCION Y CONTROL DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	
	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	
	PLANO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
	FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	8 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CALLE UNICA #150D		4.000			2.000	ML	8.00	EJES A DE 1-3
	NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
		CALLE UNICA #22	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	



(Handwritten signature)

SUMA DE ESTA HOJA

ML 33.58

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:		
CONTRATISTA:	PLANO:		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CALLE UNICA #285 NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #37	4.000	2.760	1.200	2.000	ML	8.00	EJES A DE 1-3 1 DE A-C
			1.200	1.320	0.75	1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
			4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	33.58	

SUMA DE ESTA HOJA



ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2	
	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	
	PLANO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
	FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #40	4.000			2.000	ML	8.00	EJES A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
			4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	33.58	


 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA





 SUMA DE ESTA HOJA
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 2			

8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC
---	---

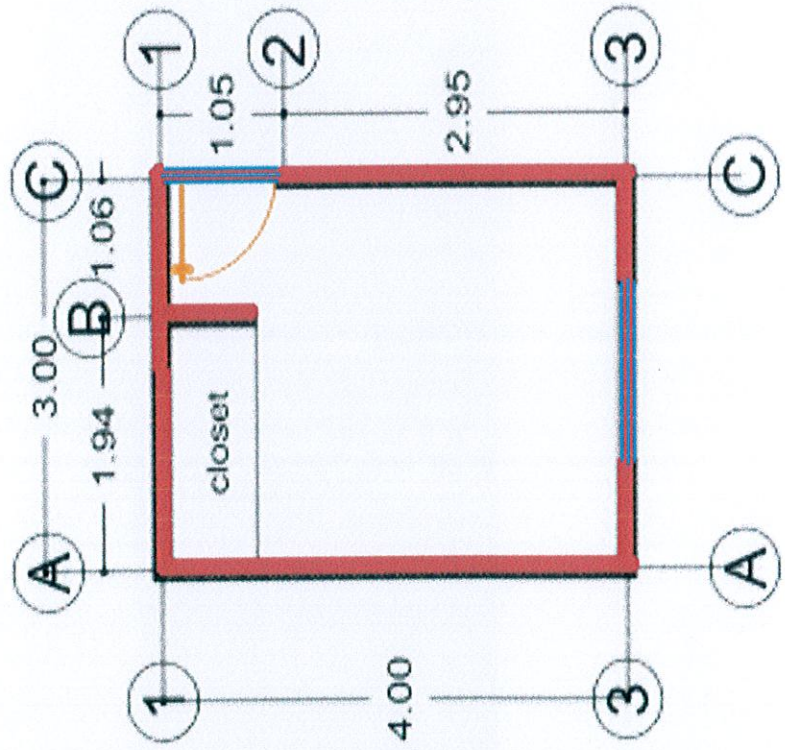

- NOVADALA EN MURO
- NOVADALA SOBRE PUERTA Y VENTANA



(Handwritten signature)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
