

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

UCO980121LC9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Belisario Domínguez, 173, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414127007

CLIENTE
 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 MZG8501012NA
 USO CFDI: P01 - Por definir
 COLON, 62, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura 452

FOLIO FISCAL (UUID)
 C1618DAC-FF3A-4E89-9B4E-D13783380B11
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404141534
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-12-28T17:17:34
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-12-28T17:05:51
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N/A	RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE LA CANTIDAD DE \$178,170.94(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100MN) POR CONCEPTO DEL 3 ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYAN DELEGACION DE CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. AFIANZADORA: SOFIMEX S.A. FIANZA DE ANTICIPO No.:2252807 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:2252815 CONTRATO No.: DOP/FAIS33/2018-07/030 RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 MONTO PARA EFECTO AL PAGO: \$ 178,170.94 Clave Prod. Serv. - 81101513 Gestión de construcción de edificios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 153,595.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24,575.30	\$ 153,595.64	\$ 153,595.64

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COE-ADEMUNY VINCULACION CON DELEGACIONES
 27 DIC 2018

RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS, 94/100 MXN

SUBTOTAL \$ 153,595.64

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 24,575.30

TOTAL \$ 178,170.94

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 CONTRATISTA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UcE1fd/WCqm8mNszgR/wbzSV2MfnJpGdlsnkR7QICbFbDCLIDBrh5JpzTIX3BSmR6jfyf/SXIH2ulrx1QF7eNwm4CbdTDgdA7J0/2fqomcTxIthwnXPVIEp7/0/IVtelgSR4ZR0Daq6IA3zPFKHgE5vpwv93HcP7XbHGp7bC75n4vU4z1PBvluGeGdXzzmYzhtH3wp3qjdcjmajic2CqnNIWxhNp35nwXxDEDAdn7Soci8I7SvUvV+JylYnzgqHimP DqCZ8+MBnPD4y32K64Scidj9SkNcU/foxd8wPnEcWeQWLWLSB5cmil+2eWRXfIM6r+0e+IzXfRM4Bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a/pX2w4vp89Q/cS8c+pTc8z4R8SEJ4xINLYP/wEdUjgFbYXj5YfDJOI7+R18h5qL1sE9vZFUHmWb3wqCqUXJNB9QMBRk5aeVURXPqZ1GzgvzUM5T6nAxjoA9D8GqBx 6Hj8CINKpCVsnOJu711wts0CQFZL8hP/AE86Wp+Jl5EYaSiZq0gnMhrHwJy4qCqShwJEPzMB/3sUpmmuV/yv3x29CQb063mbfYhKvGzH+idCCgkbrmIUYUWJmDHCfUx Spd1CqDhSUFH9dIH4WSI0Gb09cLfoaRzka58Dcqp7jIHZsx9Pp4b7qP4QZTHm1hPmA+HrbOL1px+IT+GgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C1618DAC-FF3A-4E89-9B4E-D13783380B11|2018-12-28T17:17:34|FMD100203JS7|UcE1fd/WCqm8mNszgR/wbzSV2MfnJpGdlsnkR7QICbFbDCLIDBrh5JpzTIX3BSmR6jfyf/SXIH2ulrx1QF7eNwm4CbdTDgdA7J0/2fqomcTxIthwnXPVIEp7/0/IVtelgSR4ZR0Daq6IA3zPFKHgE5vpwv93HcP7XbHGp7bC75n4vU4z1PBvluGeGdXzzmYzhtH3wp3qjdcjmajic2CqnNIWxhNp35nwXxDEDAdn7Soci8I7SvUvV+JylYnzgqHimPDqCZ8+MBnPD4y32K64Scidj9SkNcU/foxd8wPnEcWeQWLWLSB5cmil+2eWRXfIM6r+0e+IzXfRM4Bw==|00001000000405535779||



CONTROL DE OBRA PUBLICA

ASIGNACIÓN No. : DOP/FAIS33/2018-07

FECHA : 10 DE DICIEMBRE 2018

O. DE T. S/N

CONTRATISTA: **URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C** PERIODO: 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"

LOCALIDAD : CIUDAD GUZMAN, JAL.

FECHA DE INICIO : 07 DE OCTUBRE DE 2018

ESTIMACIÓN : 3ERA ESTIMACION

RESUMEN DE DOCUMENTO

IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$204,794.19	\$204,794.19
ADITIVA		
DEDUCTIVA		
ESCALATORIA		
16 % I.V.A.	\$32,767.07	\$237,561.26
AMORTIZACIÓN 25%	\$59,390.32	\$178,170.94
TOTAL A FACTURAR	\$178,170.94	

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE

AVANCE %

FECHA INICIAL	07 DE OCTUBRE 2018
FINANCIERO	99.46%
DOCUMENTO	0.00%
FISICO	99.28%
FECHA DE TERMINO	15 DE DIC. DE 2018

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$816,878.15	ESTA ESTIMACION	\$237,561.26	ANTICIPO 25 %	\$204,219.54
CONVENIO ADICIONAL		ACUM. ANTERIOR	\$573,457.23	AMORT. ANTERIOR	\$143,364.31
SUMA ESCALATORIA		ACUM. ACTUAL	\$811,018.49	ESTA AMORTIZACION	\$59,390.32
TOTAL	\$816,878.15	SALDO	\$5,859.66	TOTAL AMORTIZADO	\$202,754.63
				SALDO	\$1,464.91

DETALLES	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	SUMA
IMPORTE	\$153,595.64	\$-	\$-	0	\$153,595.64
16 % I.V.A.	\$24,575.30	\$-	\$-	0	\$24,575.30
TOTAL A FACTURAR	\$178,170.94	\$-	\$-	0	\$178,170.94
2 AL MILLAR INST. CAPAC.	\$0.00	\$-	\$-	0	\$-
5 AL MILLAR SFP	\$0.00	0	\$-	0	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$178,170.94		\$-	0	\$178,170.94

REFERENCIAS:
OBSERVACIONES:



ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
CONTRATISTA

RECIBIDO
21 DIC 2018

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COP/ADENUN Y DELEGACION CON DELEGACIONES

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 1 DE 5

EST. No. 3

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"
MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
A01	PRELIMINARES								
01	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.90	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
02	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO LAS VECES QUE SE REQUIERA (UN SOLO PAGO)	M2	9.56	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
A02	PISO FIRME								
03	PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	287.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
A03	INSTALACION PLUVIAL								
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO	M	90.49	45.00	45	0.00	0.00	0.00	\$ -



ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ARG. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 2 DE 3

EST. No. 3

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"
CONTRATO:	DOP/FAIS33/20	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	OBSERVACIONES	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
05	ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	361.32	544.80	498.75	0.00	0.00	0.00	\$
06	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.69	45.00	330	0.00	0.00	285.00	\$
07	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	189.33	810.00	744.3	65.70	\$153,357.30	-\$213,614.10	-\$



[Signature]
ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

[Signature]
ARG. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 3 DE 5

EST. No. 3

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-
		MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.	FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'c=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	186.12	255.90	117.53	134.32	0.00	0.00 \$	24,999.64
A05	CUBIERTA								
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA CON DIMENSIONES DE (80X24X9)CMS MARCA NOVACERAMIC, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA, NERVADURAS DE (10X9) CMS DE CONCRETO (F'c=200KG/CM2), CAPA DE COMPRESION DE LA MISMA CALIDAD DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6X6 10/10, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	441.52	180.00	0	180.00	0.00	0.00 \$	79,473.60

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 4 DE 5

EST. No. 3

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.		FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
10	TEN-079 TENDIDO DE ZAVALETA O CHAFLAN CON PEDACERA DE LADRILLO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP. 1:3	M	86.84	210.00	0	195.60	0.00	0.00 \$	16,985.90
A06	INSTALACION ELECTRICA								
11	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO	SAL	638.62	15.00	0	15.00	0.00	0.00 \$	9,579.30
12	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL OCULTA PARA CONTACTO SENCILLO	SAL	590.18	15.00	0	15.00	0.00	0.00 \$	8,852.70
A07	PUERTAS Y VENTANAS								
13	INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X1.18 CON UN MODULO FIJO Y UN CORREDIZO CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3473.5	15.00	0	15.00	0.00	0.00 \$	52,102.50

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



[Handwritten signature in blue ink]

ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 5 DE 5

EST. No. 3

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.		FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
14	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON MELANINA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4870.49	15.00	0	15.00	0.00	0.00	73,057.35
A08	LIMPIEZA FINA DE OBRA	M2	14.25	180.00	0	0.00	0.00	0.00	-

[Handwritten Signature]

ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

TOTAL DE ESTA HOJA	\$ 204,794.19
TOTAL PRESENTE ESTIMACION	\$ 204,794.19
IMPORTE PARA FACTURACION	\$ 204,794.19
16% IVA	\$ 32,767.07
MENOS IMPORTE ANTICIPO POR AMORTIZACION 25%	\$ 59,390.32
SUB-TOTAL	\$ 178,170.95
IMPORTE TOTAL POR PAGAR IVA INCLUIDO	\$ 178,170.95

[Handwritten Signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
NIVEL:	EST. No. 3		
	PLANO:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	
	FECHA:		
			CONTRATO: DOI/FAIS33/2018-07

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLEUNICA #74		0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
						6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
						3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
						2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	54.00	
		CALLEUNICA #75		0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
						6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
						3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
						2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	54.00	
		CALLE UNICA # 79		0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
						6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
						3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
						2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	54.00	
	SUMA DE GENERADOR						ML	162.00	


 ING. JOSE DAVID SAMAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA




 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
CONTRATISTA:	EST. No. 3	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018
NIVEL:			

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLEUNICA #17A		0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
					TOTAL			54.00	
	CALLEUNICA #80			0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
					TOTAL			54.00	
	FRANCISCO VILLALVAZ#H 50			0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
					TOTAL			54.00	
	SUMA DE GENERADOR			0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
					TOTAL			54.00	
							ML	162.00	



SUMA DE GENERADOR
 ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 3	FECHA:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
			10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO Y TODO LO OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	FRANCISCO VILLALVAZOH# 56		0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL			54.00
	JOSE M DE J MUNGUA 1444			0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL			54.00
	JOSE SOLANO# 31			0.090	3.00	7.000	ML	21.00	A-A DE 1A 3
				0.090	3.00	6.000	ML	18.00	C-C DE 1A 3
				0.090	3.00	3.000	ML	9.00	1-1 DE A-C
				0.090	3.00	2.000	ML	6.00	3-3 DE A-C
						TOTAL			54.00



SUMA DE ESTA HOJA
SUMA DE GENERADOR

[Handwritten Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCION	CALLE UNICA # 75	4.000 2.760 1.200 1.320 0.75			2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 TOTAL	ML ML ML ML ML ML	8.00 5.52 1.20 1.32 0.75 16.79	A DE 1-3 1 DE A-C C-C DE 1-2 3-3 DE A-C B DE 1-2
		CALLE UNICA # 79	4.000 2.760 1.200 1.320 0.75			2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 TOTAL	ML ML ML ML ML ML	8.00 5.52 1.20 1.32 0.75 16.79	A DE 1-3 1 DE A-C C-C DE 1-2 3-3 DE A-C B DE 1-2
		CALLE UNICA # 17A	4.000 2.760 1.200 1.320 0.75			2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 TOTAL	ML ML ML ML ML ML	8.00 5.52 1.20 1.32 0.75 16.79	A DE 1-3 1 DE A-C C-C DE 1-2 3-3 DE A-C B DE 1-2
	SUMA DE ESTA HOJA					16.79	ML	50.37	


 ING. JOSE DAVID DOMINIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA




 ING. FILEMÓN LOPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 3	FECHA:	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
			10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUCION	CALLE UNICA # 80	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
		FRANCISCO VILLALVAZO #50	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
		FRANCISCO VILLALVAZO #56	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
						TOTAL	ML	50.37	


SUMA DE ESTA HOJA
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:		
CONTRATISTA:	PLANO:		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	
	EST. No. 3		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/GM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	JOSE M DE J MUNGUJIA #1444	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
		JOSE SOLANO #31	4.000			2.000	ML	8.00	A DE 1-3
			2.760			2.000	ML	5.52	1 DE A-C
			1.200			1.000	ML	1.20	C-C DE 1-2
			1.320			1.000	ML	1.32	3-3 DE A-C
			0.75			1.000	ML	0.75	B DE 1-2
						TOTAL	ML	16.79	
	SUMA DE ESTA HOJA						ML	33.58	
	SUMA DE ESTA HOJA						ML	134.32	


 ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			

8 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC,

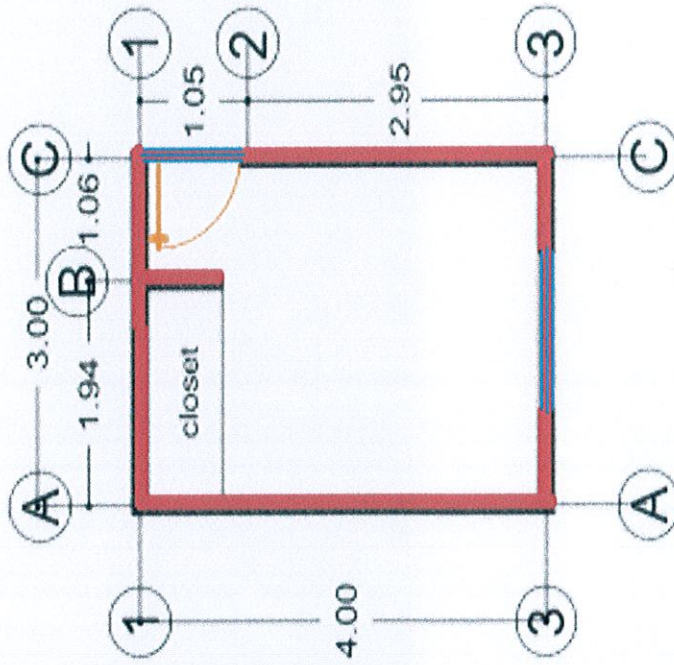

NOVADALA MARCA
NOVACERAMIC

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC,			



[Handwritten Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

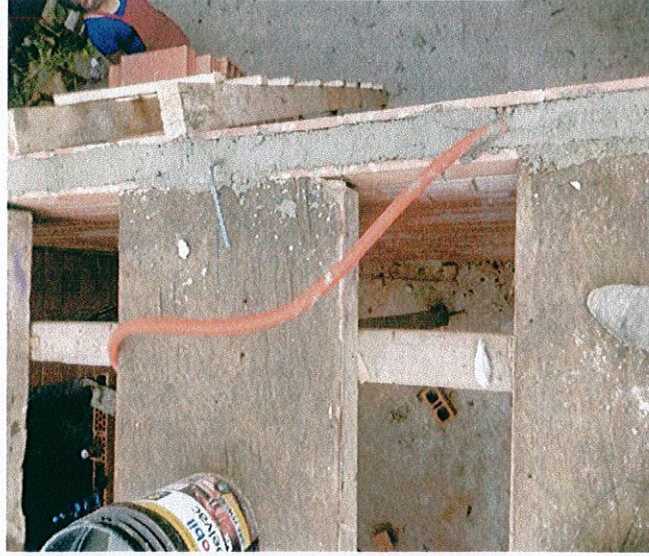

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



[Handwritten Signature]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:		
CONTRATISTA:	PLANO:		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	
	EST. No. 3		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA CON DIMENSIONES DE (80X24X9)CMS MARCA NOVACERAMIC, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA, NERVADURAS DE (10X9) CMS DE CONCRETO (F' C=200KG/CM2), CAPA DE COMPRECION DE LA MISMA CALIDAD DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6X6 10/10, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 150D CALLE UNICA # 22 CALLE UNICA # 285 CALLE UNICA # 37 CALLE UNICA # 40 CALLE UNICA # 69 CALLE UNICA # 74 CALLE UNICA # 75 CALLE UNICA # 79 CALLE UNICA # 17A CALLE UNICA # 80 FRACISCO VILLALVAZO #50 FRACISCO VILLALVAZO #56 FRACISCO VILLALVAZO #1444 JOSE SOLANO #31	4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	EJE A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3
SUMA DE GENERADOR								180.00	


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3				

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA

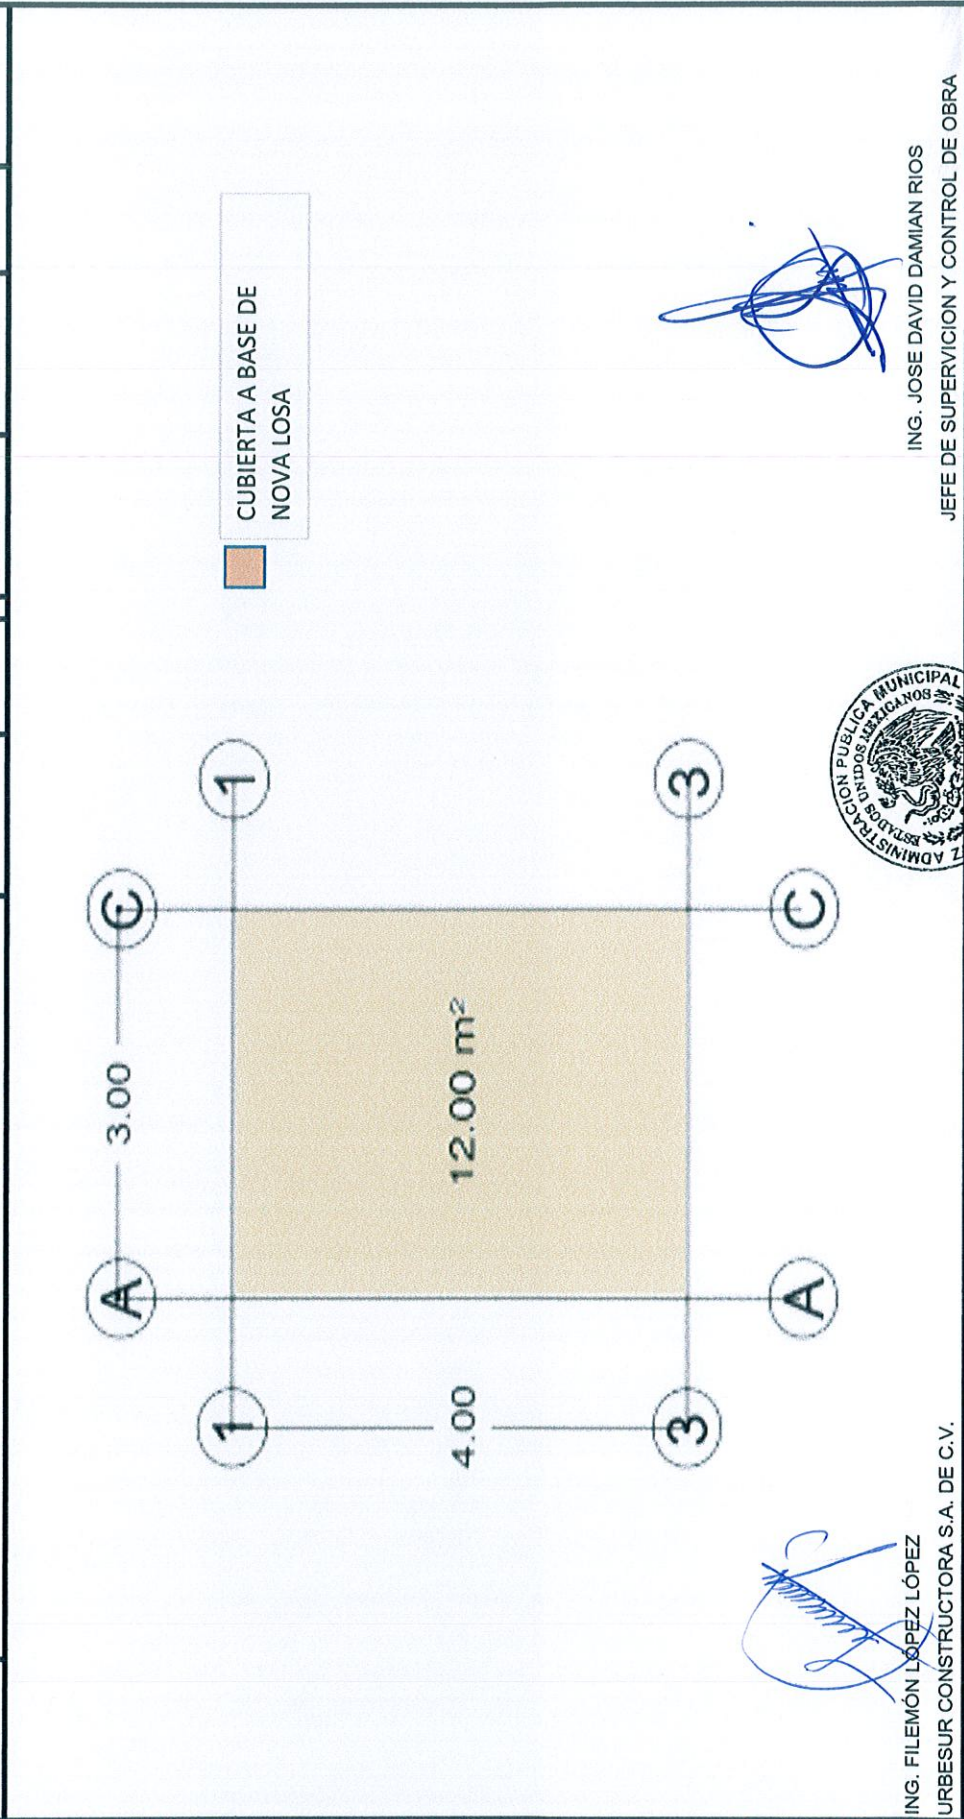

ING. FILEMÓN LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS3/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA				

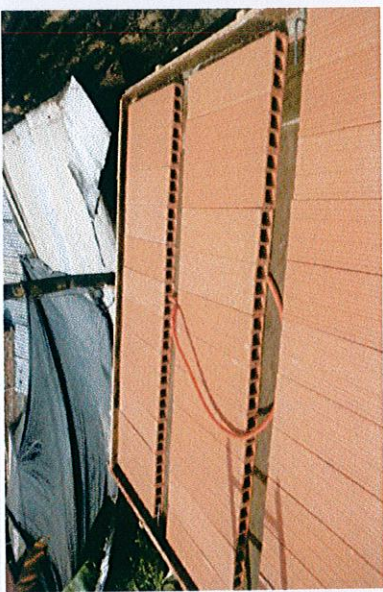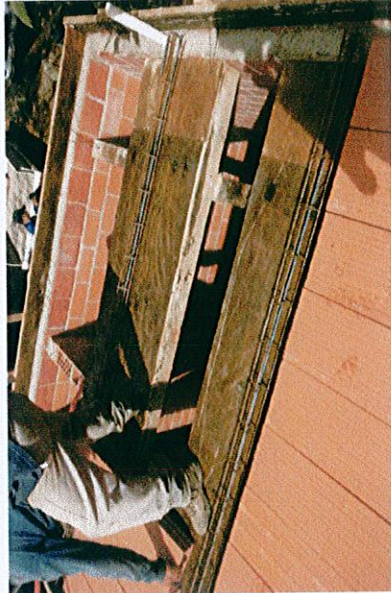

Filemon Lopez Lopez
 FILEMON LOPEZ LOPEZ

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Jose David Damian Rios
 JOSE DAVID DAMIAN RIOS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
10	TEN-079 TENDIDO DE ZAVALETA O CHAFLAN CON PEDACERA DE LADRILLO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP. 1:3	CALLE UNICA # 150D	3.760	2.760		2.000	M	13.04	EJE A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 22	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 285	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 37	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 40	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 69	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 74	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 75	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 79	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 17A	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 80	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #50	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #56	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #1444	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
		JOSE SOLANO #31	3.760	2.760		2.000	M	13.04	A-C-DE 1 A 3
								195.60	



[Handwritten signature]

SUMA DE GENERADOR

[Handwritten signature]
ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			

11
 INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE
 FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO

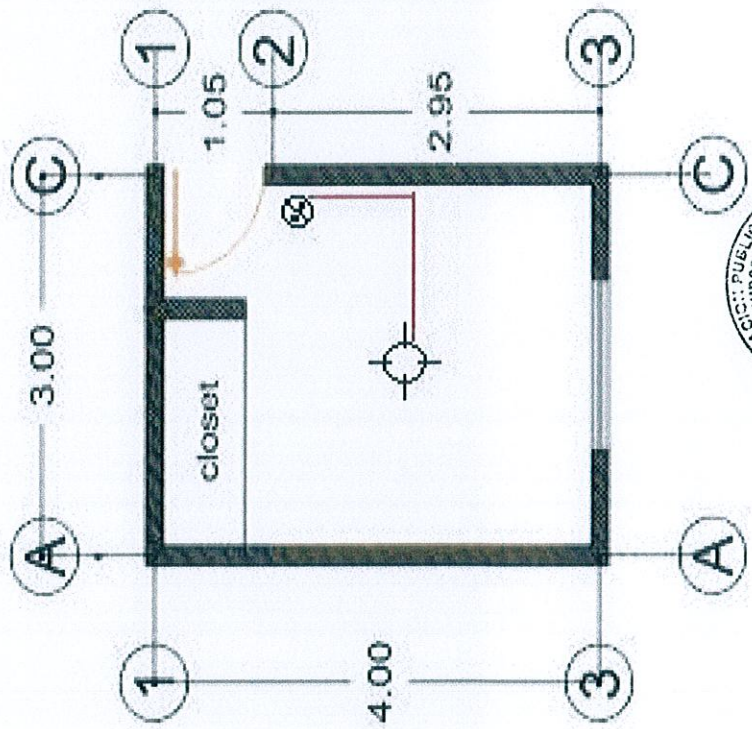

FILEMON LOPEZ LOPEZ

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



JOSE DAVID DAMIAN RIOS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			

11	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO			
----	---	--	--	--

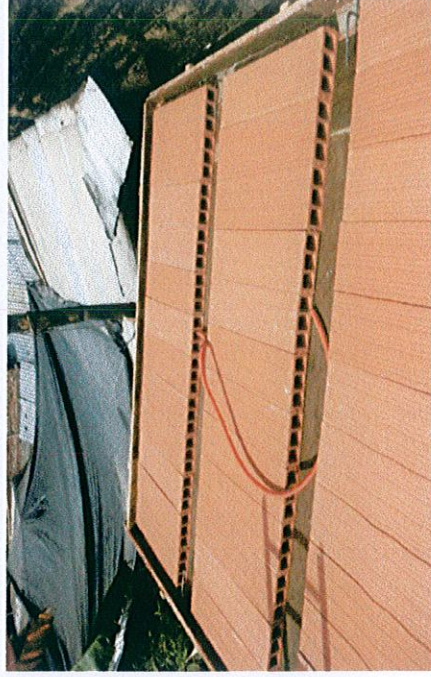

Filemon Lopez Lopez

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Jose David Damian Rios

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
12	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL OCULTA PARA CONTACTO SENCILLO	CALLE UNICA # 150D				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 22				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 285				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 37				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 40				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 69				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 74				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 75				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 79				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 17A				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		CALLE UNICA # 80				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #50				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #56				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		FRACISCO VILLALVAZO #1444				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
		JOSE SOLANO #31				1.000	PZA	1.00	A-C-DE 1 A 3
							PZA	15.00	



SUMA DE GENERADOR

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

(Handwritten signature)

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 3		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07

12	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL OCULTA PARA CONTACTO SENCILLO
----	--

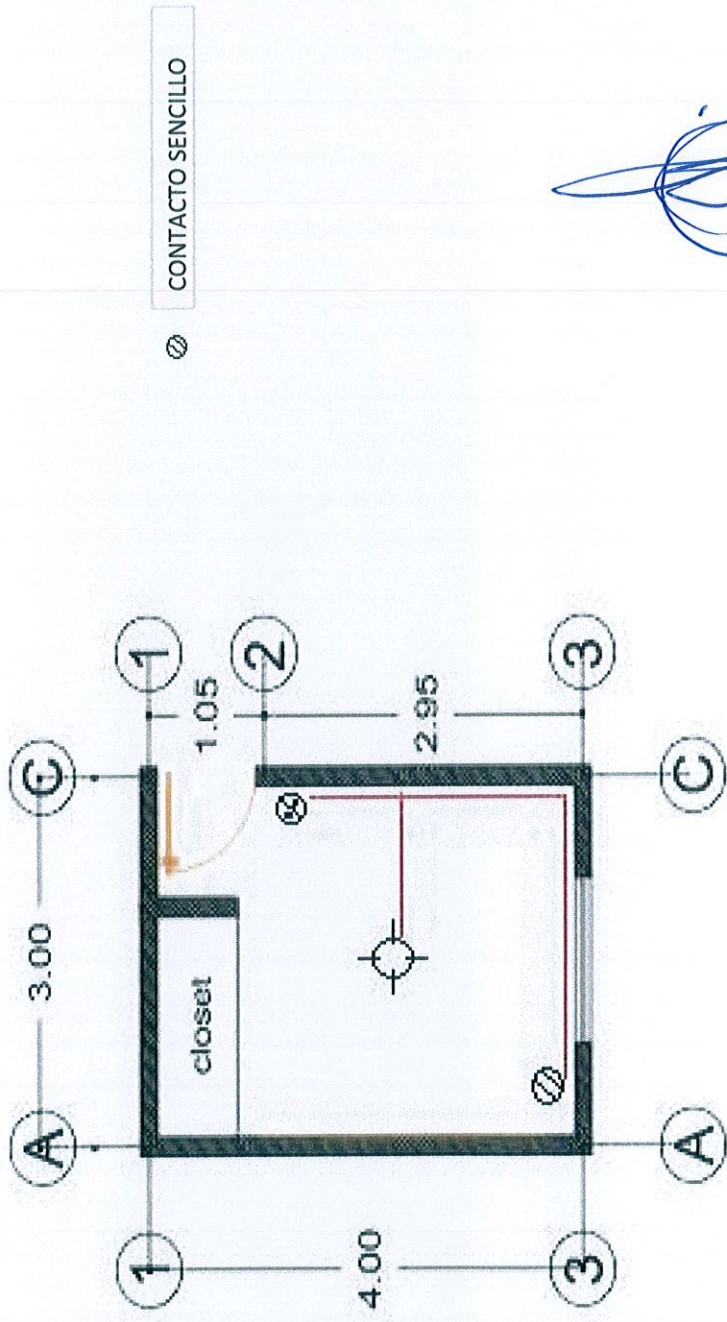

Filemón López López

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Jose David Damián Ríos

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:		
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	13 INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X1.18 CON UN MODULO FIJO Y UN CORREDIZO CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CALLE UNICA # 150D CALLE UNICA # 22 CALLE UNICA # 285 CALLE UNICA # 37 CALLE UNICA # 40 CALLE UNICA # 69 CALLE UNICA # 74 CALLE UNICA # 75 CALLE UNICA # 79 CALLE UNICA # 17A CALLE UNICA # 80 FRACISCO VILLALVAZO #50 FRACISCO VILLALVAZO #56 FRACISCO VILLALVAZO #1444 JOSE SOLANO #31	1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320	2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"	1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	EJES 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C 3 DE A-C


 PZA 15.00
 ING. JOSE DAVID BARRIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA



SUMA DE GENERADOR


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			
13	INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X1.18			

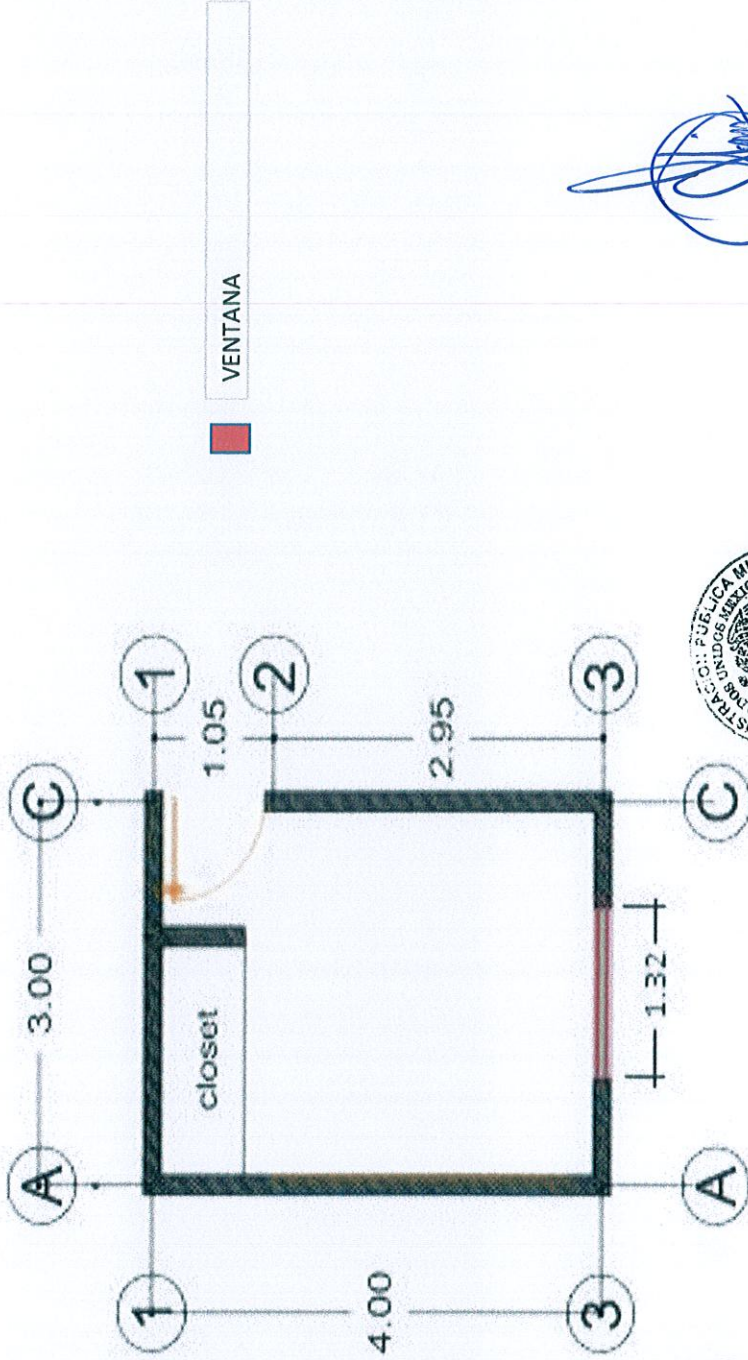

[Handwritten Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



[Handwritten Signature]


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
CONTRATISTA:	EST. No. 3			
NIVEL:				
14	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M			

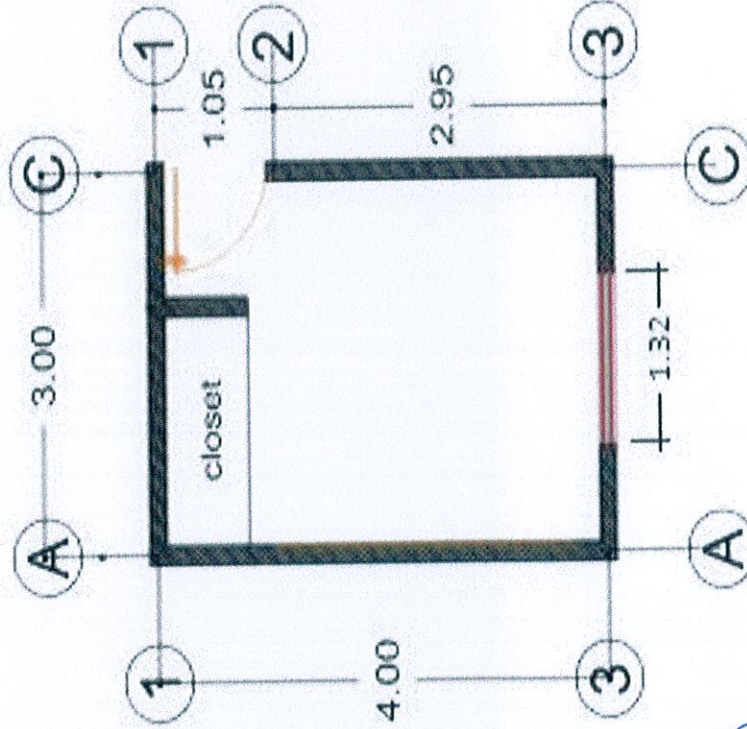

ING. FILEMÓN LÓPEZ-LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAVIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3		
		10 DE DICIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	14 INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON MELANINA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	CALLE UNICA # 150D		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	EJES CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 22		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 285		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 37		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 40		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 69		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 74		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 75		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 79		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 17A		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
		CALLE UNICA # 80		0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
	FRACISCO VILLALVAZO #50			0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
	FRACISCO VILLALVAZO #56			0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
	FRACISCO VILLALVAZO #1444			0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2
	JOSE SOLANO #31			0.900	2.20	1.000	PZA	1.00	CENTRE 1-2

SUMA DE GENERADOR

PZA 15.00



ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES CERA

"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 3	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
8 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC.			

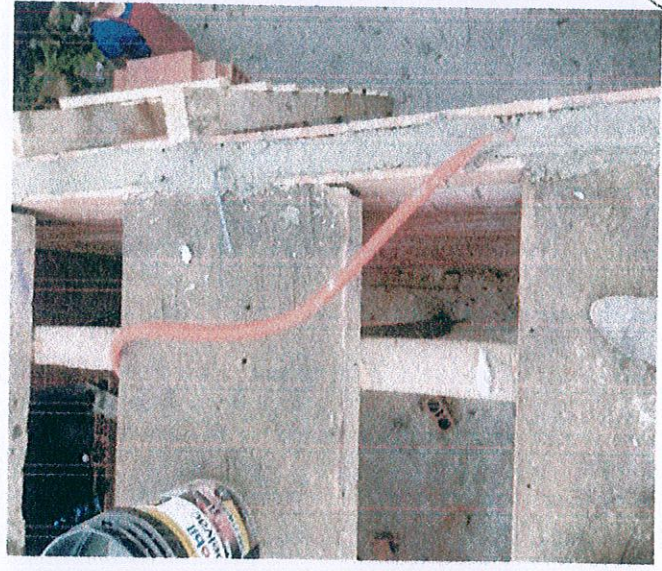

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NÚM. GENERAL: JORES CBRA

"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO:	DOP/FAIS332018-07
NIVEL:	EST. No. 3	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018

9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA
---	---

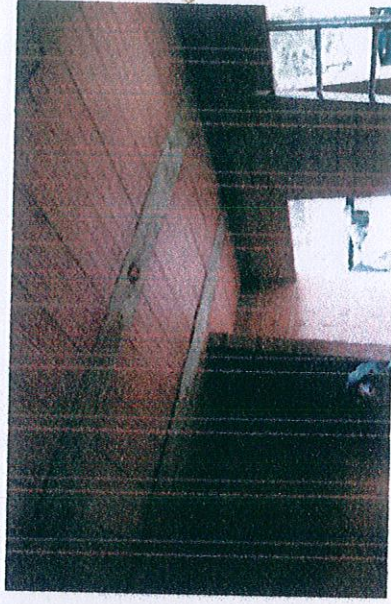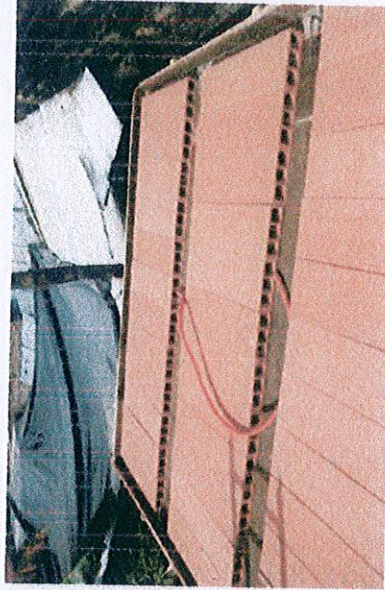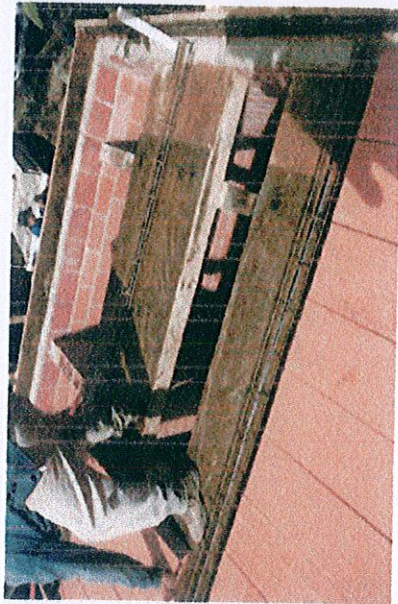

[Handwritten signature]
 ING. FILEMÓN LOPEZ LOPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LOPEZ LOPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES: CBRA		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018
INTEL:	EST. No. 3	CONTRATO: DOP/FAISS3/2018-07	
11	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO		

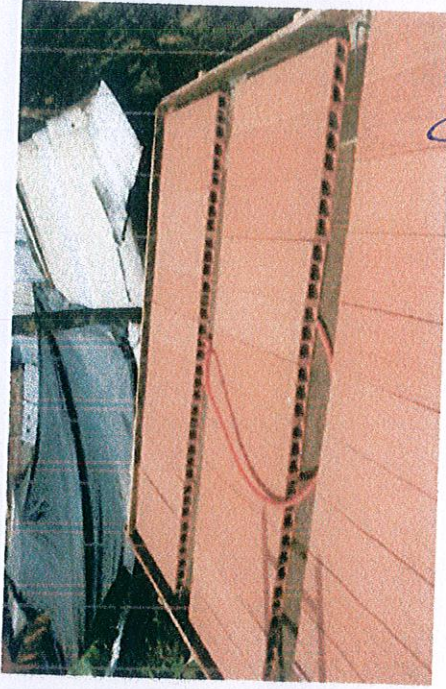

[Handwritten signature]
 ING. FLEMON LOPEZ LOPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




[Handwritten signature]
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPI/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 3			
14	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON MELANINA			

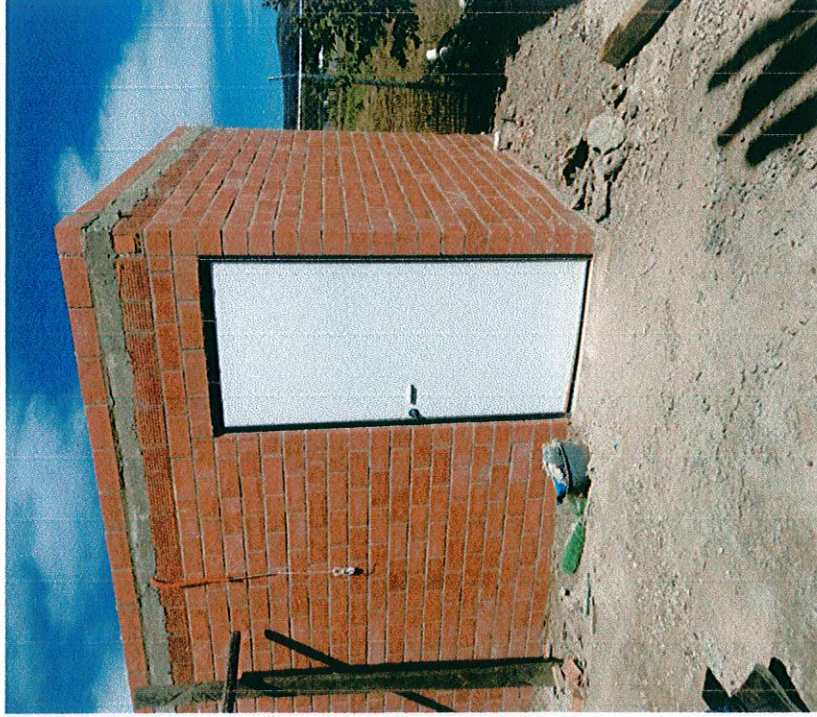

Filemón López López
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



Jose David Daman Rios
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ,
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, JOSE DAVID DAMAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
OBRA:	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 3	10 DE DICIEMBRE DEL 2018	
TEN-079 TENDIDO DE ZAVALETA O CHAFLAN			
10			

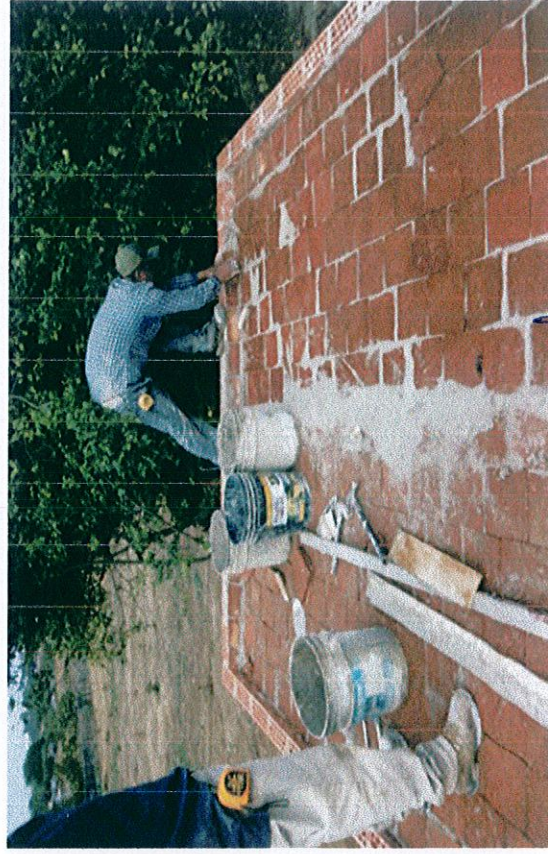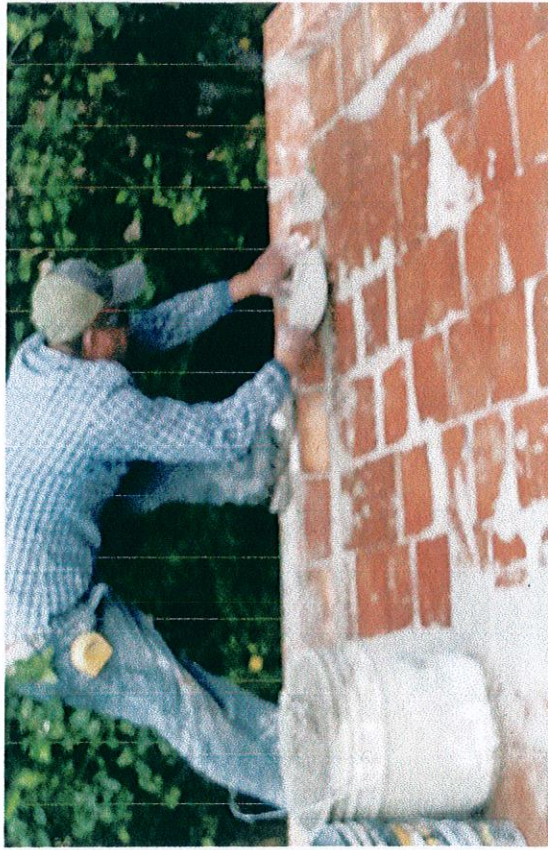

Filemón López López

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



Jose David Damian Rios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
