



**SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

RFC: CATS931108IT6 ABASOLO No. 61 CENTRO, TECALITLAN 49900 TECALITLAN JALISCO México

<b>I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: 9</b>
FECHA: 27/12/2018 10:50:39
Folio Fiscal: 4611075D-86ED-4305-8452-D154ADE422CC Fecha y hora de certificación: Diciembre 28 2018 - 10:45:41 Serie del Certificado del emisor: 00001000000412505599 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
<b>CONDICIONES:</b>
<b>USO CFDI: G03 - Gastos en general</b>

EXPEDIDO EN: CP: 49900

<b>CLIENTE:</b> 01 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	<b>R.F.C.:</b> MZG8501012NA
<b>DOMICILIO:</b> Av. Colon No. 62, COLONIA: Centro, POBLACIÓN: Ciudad Guzmán, Jalisco, C.P.: 49000	
<b>FORMA DE PAGO:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos, <b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición, <b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano	
<b>Observaciones:</b>	Referencia:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	01 SAT: 30191800	RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 1,636.71 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS .71/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT UBICADA EN LA CALLE INTENACIONAL No. 15 EN LA COLONIA CRUZ ROJA EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO DOP/FFIB/2018-09/020 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3502-12217-3 Y FINZA DE CUMPLIMIENTO # 3502-12218-2 ASERTA AFINZADORA S.A. DE C.V.	1,410.96	002 - IVA - 225.75	1,410.96

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
<b>CFDI Relacionado:</b>
<b>Tipo Relación:</b> -
<b>CFDI Relacionado:</b>

SUBTOTAL:	1,410.96
ImpuestosTrasladados	
I.V.A. 16%:	225.75
<b>TOTAL:</b>	<b>1,636.71</b>

Sello digital del CFDI  
LKH9E6ujkDPvQYiClDv78qP3iOppYr2vyQoO9yvz056M2/SjCVWl9XMcAJSakKFRjg/XHV9x5EaboD5c55+  
fJIMiYFzwmvNcd9TdgLuwkRWChVLIa9ZYLutB6D/JQ27WPLKcp024uGMejmf8Gm1JZ0H2AIQ5rJpF1SVPx8sY  
uYWARITM44brkHI2T/WnitgGunMBdqW1LJyo757yKV5Bvci5JhU6RcPg+AtUqa3m3BD9qAB54T/mRU6TJkhz  
+9OWzJwW0QXJaJwUqNzpykzJ1S+19IOnpZL8iIWkdxR9g6fh8bl3xFdXs/drFpkfJ9dSogt1DihjuSg==

Sello del SAT  
V7POLtJAc7XiJOWMoEpQOnEINKv7IysFnXC5BivcALlaxmIDTJzvQAJa/IHuHmIrfPuW3wbqaj7h  
8dDM7chVx9/Ox7JbcTXFAlDGLmoS32XokwWZhdobWYUIM1DUmSt114Hybgwh24CA5q/Sv+WRtv  
ShW5q4IU+zKX8VGEeDCKeolN9Rr+2kpin43buJzySBrXbkKuyomn+rnrTHOqKYeApbjpcYs1Iv+X5  
Z6tDDOUJcOmQObuI+bsay5EXZpS7I/1dZpiieQ/pONUu+4Ky8VrB00MqzpjPxx5cfxnAu2MXIAK  
0BIFxbG5BC28MVV87415A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1.1]4611075D-86ED-4305-8452-D154ADE422CC[2018-12-28T10:45:41]MAS0810247C0JLKh9  
E6ujkDPvQYiClDv78qP3iOppYr2vyQoO9yvz056M2/SjCVWl9XMcAJSakKFRjg/XHV9x5EaboD5c5  
5+1JIMiYFzwmvNcd9TdgLuwkRWChVLIa9ZYLutB6D/JQ27WPLKcp024uGMejmf8Gm1JZ0H2AIQ5rJpF  
1SVPx8sYUWARITM44brkHI2T/WnitgGunMBdqW1LJyo757yKV5Bvci5JhU6RcPg+AtUqa3m3BD9qAB  
54T/mRU6TJkhz+9OWzJwW0QXJaJwUqNzpykzJ1S+19IOnpZL8iIWkdxR9g6fh8bl3xFdXs/drFpk  
fJ9dSogt1DihjuSg==[00001000000404486074]



<b>Banco:</b>
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO en TECALITLAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: \$1,636.71 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por lo que se pagará domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Firma de Aceptación

*Almira*

*[Handwritten signature]*

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN VINCULACION CON DELEGACION...  
RECIBIDO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**CONTROL DE OBRA PUBLICA**

FECHA: 15/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-09-020  
 Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,  
 Contratista: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
 Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT  
 Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  
 Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE  
 Estimación No.: 3 TRES (FINIQUITO) Periodo: 07/12/2018 Al: 15/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$1,881.2819	\$1,881.28
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$301.01	\$2,182.29
- Amortización	\$545.57	\$1,636.72
<b>Total</b>	<b>\$1,636.72</b>	<b>\$1,636.72</b>



Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	15/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$300,000.00	Esta Estimación	\$2,182.29
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$297,817.71
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$300,000.00
<b>Total</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>Saldo</b>	<b>\$0.00</b>

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$75,000.00
Amort. Del acumulado		\$74,454.43
Esta amortización		\$545.57
Total Amortizado		\$75,000.00
Saldo por amortizar		\$0.00

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$1,410.96	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$225.75	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$1,636.71	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$1,636.71	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$1,410.96
	\$0.00
	\$225.75
	\$1,636.71
	\$0.00
	\$0.00
	\$1,636.71

 <b>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EMPRESA	 <b>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS</b> JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
 <b>ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO</b> REPRESENTANTE LEGAL	

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CORLADEP, INY VINCULACIÓN  
 27 DIC 2018



**GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE TRABAJOS

REGION DE OBRAS PUBLICAS

**CUERPO DE ESTIMACION**

OBRA: **CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT**

ESTIMACIÓN: 3 (FINIQUITO) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO  
PERIODO DE TRABAJO DEL: 07/12/2018 AL: 15/12/2018

No. DE CONTRATO: DOPIFFIBI/2018-09/020

HOJA: 1 DE 2

CONCEPTOS	U	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	
<b>PRELIMINARES</b>									
301-PRE-01-001	M2	214.50	214.50	0.00	6.01	\$1,289.15	\$1,289.15	\$ -	\$0.00
301-PRE-04-102	M2	8.00	8.00	0.00	23.63	\$189.04	\$189.04	\$ -	\$0.00
<b>CIMENTACION</b>									
Z21	PZA	8.00	8.00	0.00	3,228.45	\$25,827.60	\$25,827.60	\$ -	\$0.00
<b>ALBAÑILERIA</b>									
304-ALB-06-014	M2	8.00	8.00	0.00	229.13	\$1,833.04	\$1,833.04	\$ -	\$0.00
<b>Subtotal esta Hoja</b>						\$29,138.83	\$29,138.83	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>						\$29,138.83	\$29,138.83	\$0.00	\$0.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ING. SIAMIY YOSAM CARDENAS DEL TORO

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECTOR

CUERPO DE ESTIMACION



**GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OBRA: **CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

ESTIMACION: 3 (FINIQUITO) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO  
PERIODO DE TRABAJO DEL: 07/12/2018 AL: 15/12/2018

No. DE CONTRATO: DOPI/FIBI/2018-09/020

HOJA: 2 DE 2

CLAVE	CONCEPTOS	U	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.		SALDO	PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	SALDO	
303-EST-02-010	<b>ESTRUCTURA METALICA</b> ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1,968.982	2109.95	0.00	-141.0 \$	74.60	\$146,886.06 \$	157,402.51 \$	-	-	\$-10,516.45
303-EST-03-001	<b>CUBIERTA DE LONA</b> CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	234.16	195.90	5.65272	32.6 \$	332.81	\$77,929.33 \$	65,197.48 \$	1,881.28		\$10,850.57
306-PYP-05-013	<b>PINTURA.</b> PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1,968.973	2109.95	0.00	-141.0 \$	2.37	\$4,666.47 \$	5,000.59 \$	-		-\$334.12
			Subtotal esta Hoja					\$229,451.86	\$227,600.58	\$1,881.28		\$0.00
			Total					\$256,620.69	\$256,739.41	\$1,881.28		\$0.00

REPRESENTANTE LEGAL



ING. SIAMIR YOSAM CÁRDENAS DEL TORO

OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR


JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

<b>GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE</b> CONTRATO No. <b>DOP/FIB/2018-09/020</b>		<b>OBSERVACIONES</b> ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO) HOJA No. 1 DE 1								
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO										
<b>NUMEROS GENERADORES DE OBRA</b>										
No.	CONCEPTO	ELEMENTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PESO	TOTAL	U
303-EST-02-010	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		A-B - 3' - 3"	0.4328270	13.06			5.65272	5.65272	M2
<b>TOTAL:</b>									5.65272	M2
REPRESENTANTE LEGAL  ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS								



GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No. DOP/FFIB/2018-09/020	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT	
UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JALISCO	
CONTRATISTA:		ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	
ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)		HOJA No. 1 DE 1	
REALIZO:			
<b>CROQUIS</b>			
303-EST-02-010	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		

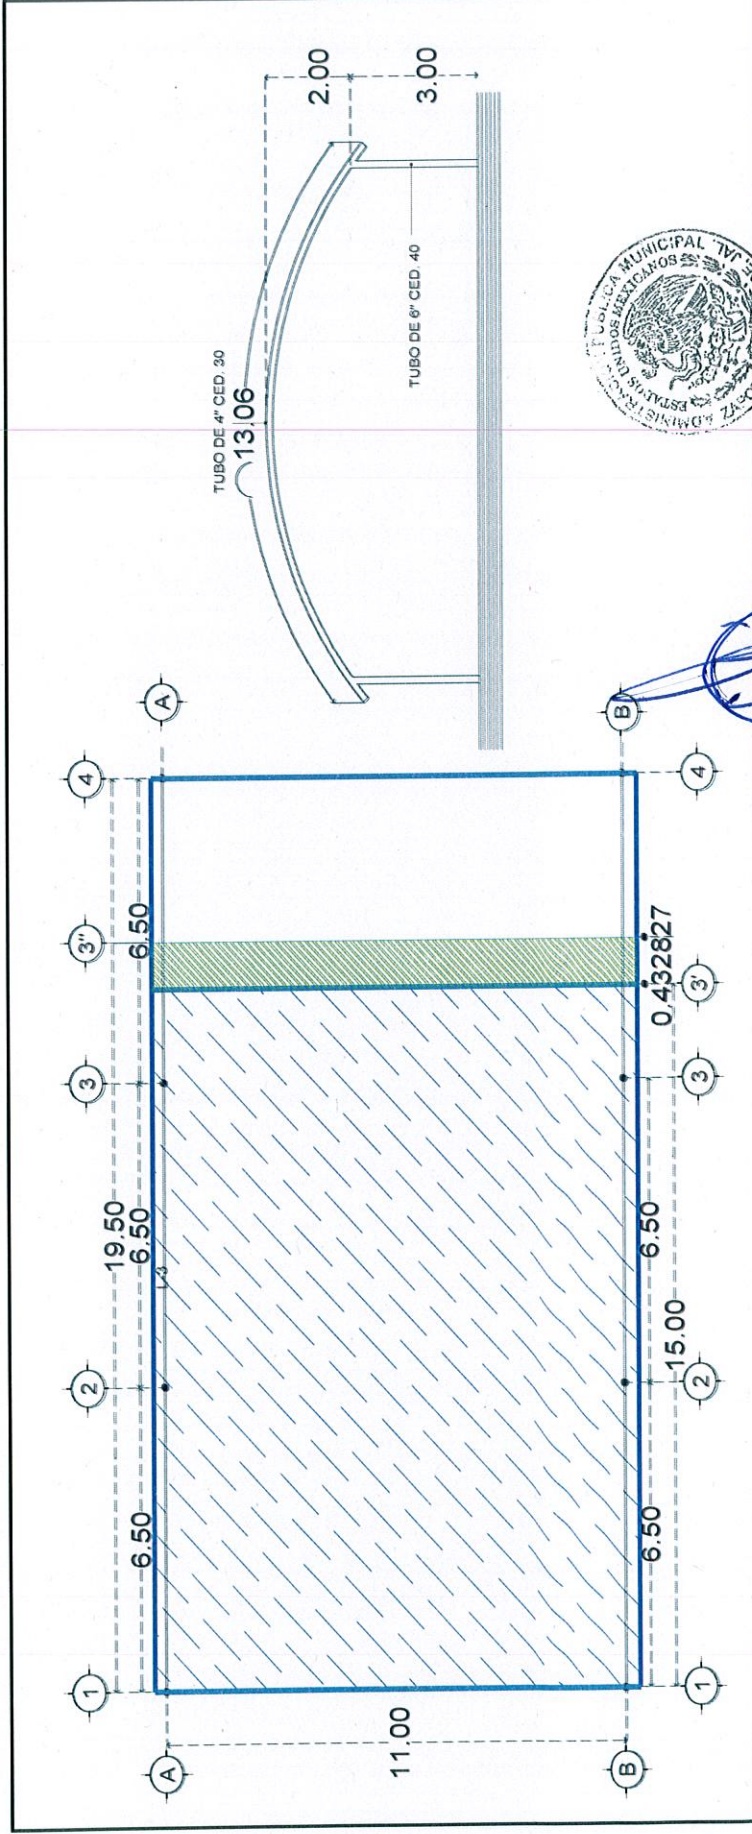

REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	ESTIMACION 3 FINIQUITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	"CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT."
OBRA:	Ciudad Guzman, Jal.
UBICACION:	ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
CONTRATISTA:	

REPORTE FOTOGRAFICO



DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES  
 27 DIC 2018  
 RECIBIDO



*[Handwritten signature]*

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
Representante Legal.

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
Director de Obras Publicas.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

*[Handwritten signature]*
